

令和7年(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンタースロープ改修工事


仮設参考図

◆図面リスト

参考図 01 仮設検討図 01(平面図)

参考図 02 仮設検討図 02(立面図)

参考図 03 仮設検討図 03(断面図)

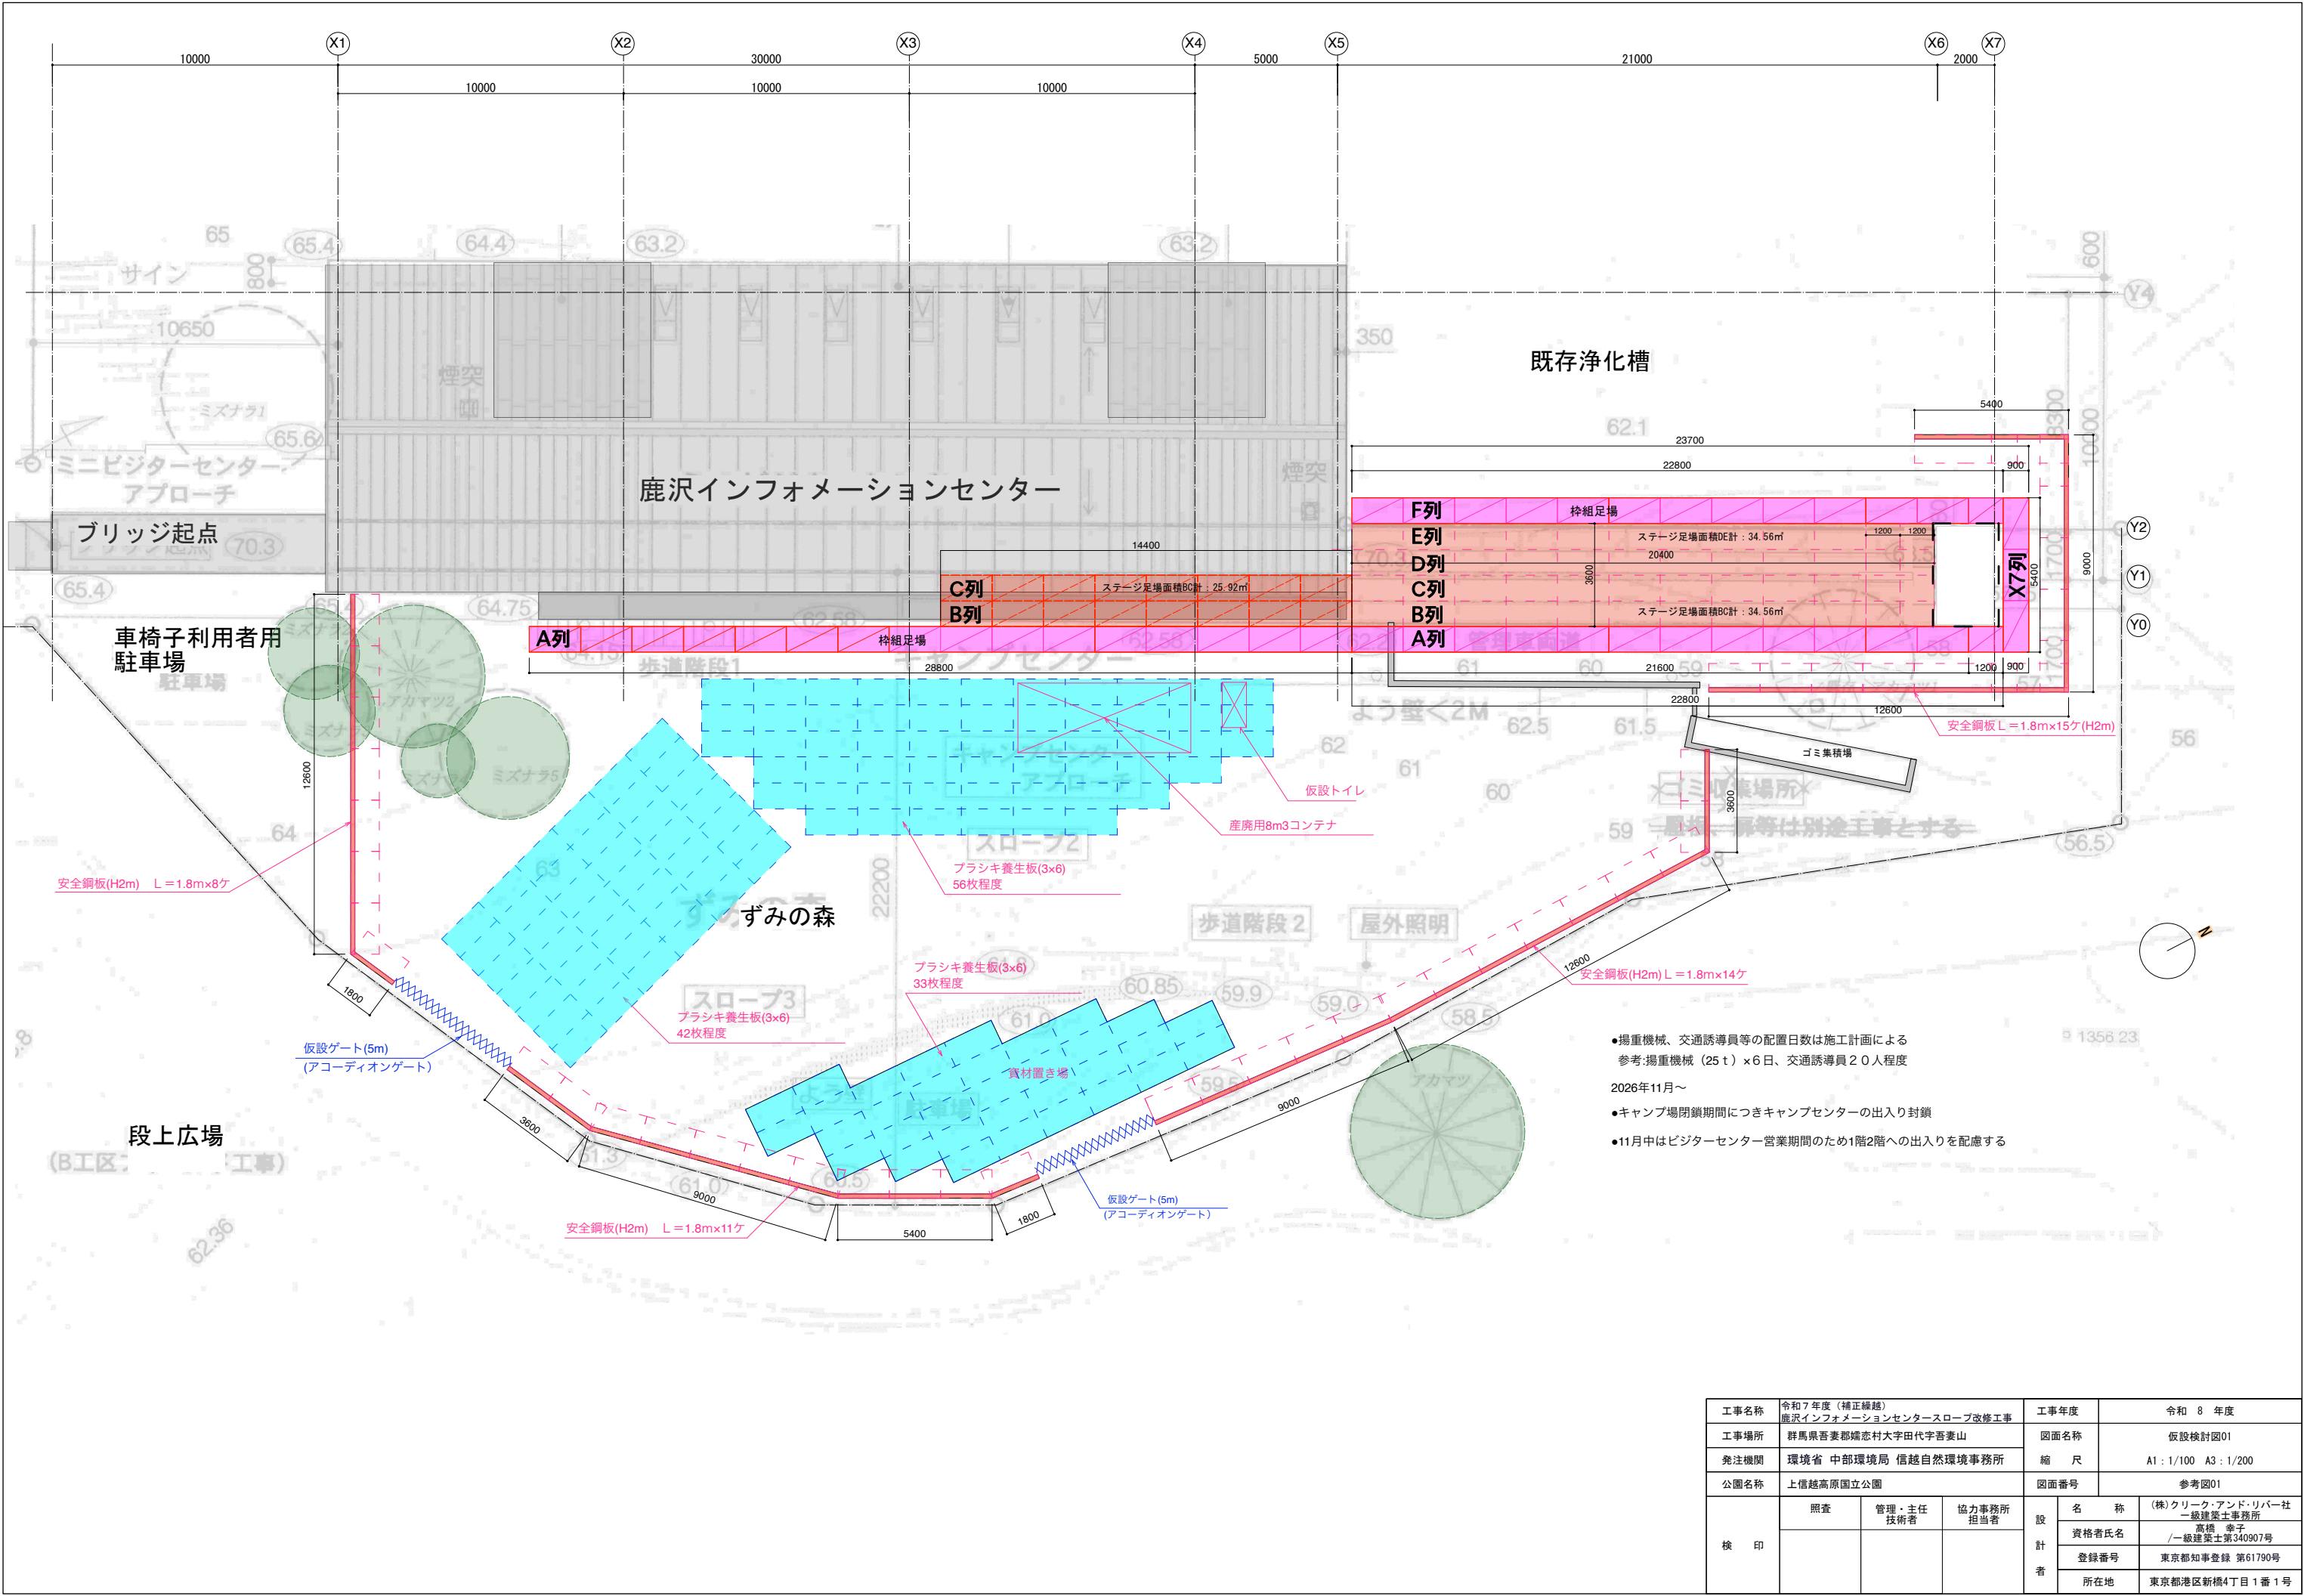

- 揚重機械、交通誘導員等の配置日数は施工計画による
参考:揚重機械 (25 t) × 6 日、交通誘導員 2 0 人程度
- 2026年11月～
- キャンプ場閉鎖期間につきキャンプセンターの出入り封鎖
- 11月中はビジターセンター営業期間のため1階2階への出入りを配慮する

工事名称	令和7年度（補正繰越） 鹿沢インフォメーションセンタースロープ改修工事			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山			図面名称	仮設検討図01	
発注機関	環境省 中部環境局 信越自然環境事務所			縮 尺	A1 : 1/100 A3 : 1/200	
公園名称	上信越高原国立公園			図面番号	参考図01	
検 印	照査	管理・主任 技術者	協力事務所 担当者	設 計 者	名 称	(株)クリーク・アンド・リバー社 一級建築士事務所
					資格者氏名	高橋 幸子 /一級建築士第340907号
					登録番号	東京都知事登録 第61790号
					所在地	東京都港区新橋4丁目1番1号
